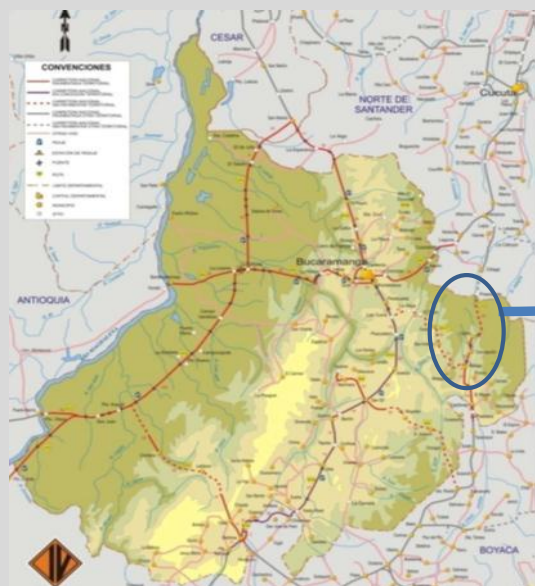


**ENTIDAD**
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROGRAMA**
**CORREDORES VIALES PARA LA PROSPERIDAD**
**PROYECTO**

**Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto "Corredor Central Troncal del Norte Fase 2" para el programa corredores prioritarios para la prosperidad**

**TRAMO**
**PALMERA (K0+00) - PRESIDENTE (K102)**
**CONTRATISTA**
**MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**
**VALOR TOTAL ACTUALIZADO (millones)**
**\$ 132.079**
**INTERVENTOR**

**CONSORCIO VIAS COLOMBIA 004 (Consultoría Colombiana - PCA)**

**VALOR TOTAL ACTUALIZADO (Millones)**
**\$ 5.364**
**FECHA INICIO**
**OCT 10 2012**
**FECHA TERMINACION**
**OCT 30 2015**
**DURACION**
**35.6 MESES**
**PLAZO TRANSCURRIDO**
**90%**
**LOCALIZACION**

**FECHA VISITA:**

Julio

2015

**LIBERACION DE ABCISAS Y DELIMITACION SECTOR A INTERVENIR EN LA FASE 2**

**SECTOR CAPITANEJO - MALAGA (K0 AL 36)**

| DE      | HASTA   | L       |
|---------|---------|---------|
| K+      | K1+580  | K1+580  |
| K4+610  | K4+820  | K+210   |
| K5+450  | K7+000  | K1+550  |
| K10+450 | K13+000 | K2+550  |
| K19+400 | K35+000 | K15+600 |

**K21+490**

**NOTA:**

SEÑALA LA INTERVENTORIA EN SU INFORME SEMANAL AL INVIAS, QUE LOS SECTORES EN EL TRAMO DE MALAGA A PRESIDENTE (14 KM) "REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES Y NUEVO PROCESO DE CONTRATACION".

ES DECIR QUE LA META FISICA SE REDUCE A 21.49 KM. UN 60% DE LA INICIAL, Y SOLO SE INTERVENDRA COMPLETAMENTE A NIVEL DE PAVIMENTO EN 5 DE LOS 7 TRAMOS CONTEMPLADOS INICIALMENTE.

**SECTOR MALAGA - PRESIDENTE (K36 AL K101)**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| K53+000 | K55+000 | K2+000  |
| K85+000 | K97+000 | K12+000 |

**K14+000**

**L. TOTAL K35+490**

| ESTADO DE AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                 |               |  |             |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------|----|-------|
| OBRA PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                            | \$ 120.896,00 |  | PORCENTAJE: |    | 92%   |
| OBRA EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                             | \$ 120.905,00 |  | PORCENTAJE: |    | 92%   |
| ADELANTO                                                                                                                                                                                                                                    | SI            |  | ATRASO      | NO | 0,01% |
| ACTIVIDADES OBSERVADAS                                                                                                                                                                                                                      |               |  |             |    |       |
| LA OBRA ESTA ACTIVA AUNQUE YA SOLO SE EFECTUAN OBRAS MENORES, SE SOLICITARON RECURSOS ADICIONALES POR 11,000 MILLONES LOS CUALES ESTAN EN TRAMITE.                                                                                          |               |  |             |    |       |
| EL CONTRATISTA NO PRESENTA ATRASO.                                                                                                                                                                                                          |               |  |             |    |       |
| AVANCE                                                                                                                                                                                                                                      |               |  |             |    |       |
| SE TIENEN 19,4 KM CON OBRAS DE ARTE Y 17,9 KM PAVIMENTADOS.<br>SE REALIZAN ALGUNOS REEMPLAZOS DE LOSAS, Y OBRAS DE ESTABILIZACION EN ALGUNOS SECTORES.<br>SE ESTAN TERMINANDO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE LA VIRGEN SOBRE EL K 32+700. |               |  |             |    |       |
| LA VIA PRESENTA MUY BUENA TRANSITABILIDAD ENTRE MALAGA Y CAPITANEJO Y SE HA REDUCIDO EL TIEMPO DE VIAJE, EXCEPTO EN LA ZONA DE INESTABILIDAD DEL K33.                                                                                       |               |  |             |    |       |
| LA CANTIDAD DE TRACTOMULAS QUE TRANSITAN POR LA VIA SE HA INCREMENTADO.                                                                                                                                                                     |               |  |             |    |       |
| UNA VEZ EFECTUADA REVISION Y AJUSTE POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA TERRITORIAL SANTANDER, ESTAN EN TRAMITE RECURSOS ADICIONALES DE \$11.000 MILLONES PARA LA OBRA.                                                                            |               |  |             |    |       |
| EN LA ACTUALIDAD SE TRAMITE PRORROGA POR TRES MESES (HASTA 30 DE OCTUBRE DE 2015), QUE INCLUYEN ADICIONALES DE \$ 3600 MILLONES PARA LA OBRA Y 450 MILLONES PARA INTERVENTORIA.                                                             |               |  |             |    |       |
| ESTOS RECURSOS ADICIONALES SE DESTINARAN COMO REFUERZO PARA LOS ACTIVIDADES EN SITIOS CRITICOS Y PARA COMPLETAR LA GESTION SOCIO-PREDIAL.                                                                                                   |               |  |             |    |       |
| DATOS DE INTERES                                                                                                                                                                                                                            |               |  |             |    |       |
| SE REPORTAN ALREDEDOR DE 100 EMPLEOS GENERADOS                                                                                                                                                                                              |               |  |             |    |       |
